

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Проектного комитета**  
**Находкинского городского округа**

02 марта 2023 года

11:00 ч.

Заседание вел – заместитель главы администрации Находкинского городского округа  
Л.А. Якименко

Присутствовали: 17 человек (список прилагается).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О реализации национальных проектов 2022 года.

Докладчик: Зубкова Татьяна Николаевна – начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа».

2. О достижении показателей и результатов региональных проектов 2022 года.

Докладчик: Свиридова Светлана Олеговна – главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа».

3. О текущей контрактации по лимитам 2023 года.

Докладчики: Марченко Екатерина Александровна – директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа»;

Лёлин Игорь Валерьевич – директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;

Ольшевская Татьяна Васильевна – начальник управления культуры администрации Находкинского городского округа;

Соловей Елена Аркадьевна – заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;

Сазонтова Ирина Петровна – начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;

Щитов Денис Андреевич – заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства».

4. О достижении показателя «Уровень оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления».

Докладчик: Якименко Лариса Александровна – заместитель главы администрации Находкинского городского округа.

---

### **1. О реализации национальных проектов 2022 года**

---

Якименко Л.А., Зубкова Т.Н.

1. Принять к сведению информацию начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» Зубковой Т.Н. о реализации национальных проектов 2022 года (приложение № 1).

---

### **2. О достижении показателей и результатов региональных проектов 2022 года**

---

Якименко Л.А., Свиридова С.О., Браташ Д.М., Кульпин С.А.

1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» Свиридовой С.О. о достижении показателей и результатов региональных проектов 2022 года (приложение № 2).

2. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа – начальника управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа Браташа Д.М. о невыполнении показателя «Объем жилищного строительства, кв. м.»

в 2022 году в связи со срывом сроков ввода объектов «Многоквартирные жилые дома, предназначенные для сдачи в коммерческий найм, по адресу: г. Находка, ул. Добролюбова 2-А, ул. Добролюбова 4-А».

---

### **3. О текущей контрактации по лимитам 2023 года**

---

Якименко Л.А., Марченко Е.А., Саидбаева О.Г., Щитов Д.А., Воронина А.А., Рой К.Е., Сазонтова И.П., Шевченко А.В.

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа Якименко Л.А. о сроках контрактации и исполнения кассового плана на 2023 год.

2. Принять к сведению информацию директора МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Находкинского городского округа» Марченко Е.А. о контрактации по лимитам 2023 года в плановом режиме:

– **Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Находкинского городского округа»:** 14.02.2023 заключен муниципальный контракт на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК «Ирна», территорией СНТ «Приморец», территорией ЖСК «Залив Тунгус» и обходной магистралью в г. Находка.

– **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа»:** сквер «Школьный» – переходящий контракт прошлого года, работы будут выполняться в текущем году; «Видовая площадка № 2» – контракт заключен, подрядчик определен; сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру» – контракт на стадии заключения.

– **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Находкинского городского округа»:** по всем трём объектам («Установка детской площадки в с. Душкино», «Ремонт площадки у памятника жителям села Душкино, павшим в сражениях Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.г.», «Обустройство ливневых стоков по ул. Набережная, с. Анна») определены исполнители, плановая дата заключения контрактов – 14.03.2023.

– **Муниципальная программа «Развитие образования в Находкинском городском округе»:** по всем детским садам подрядчики определены по результатам аукционов, будут две простые закупки, из них по одной заключен контракт.

– **План социального развития центров экономического роста Находкинского городского округа:** По мероприятию «Проведение работ по капитальному ремонту спортивного ядра стадиона «Водник» по ул. Владивостокская, 56 в г. Находка» определен подрядчик, образовалась экономия. По мероприятию «Приобретение и установка модульных спортивных залов (МАОУ СОШ №2 НГО)» подача заявок осуществляется до 03.03.2023, на сегодняшний день поступила одна заявка, плановая дата заключения контракта – 14.03.2023. По мероприятию «Благоустройство дворовых территорий (реализация программы «1000 дворов»)» определен подрядчик, контракт будет заключен до 15.03.2023.

– **Губернаторская программа «1000 дворов»:** заключен контракт на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

– **Национальный проект «Культура»:** большинство объектов расконтрактовано, контракты в стадии заключения, подрядчики определены. В проектах двух объектов «Капитальный ремонт помещений фондохранилища МБУК «Музейно-выставочный центр г. Находка» и «Капитальный ремонт помещений и части фасада МБУК «ГКГ «Вернисаж» г. Находка» содержалась закупка оборудования и мебели, в связи с чем на стадии закупки необходимо было внести изменения в проекты, на сегодняшний день закупки находятся в стадии согласования с Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края.

3. Принять к сведению информацию заместителя директора МКУ «Управление капитального строительства» Щитова Д.А. об оплате 60% контракта по техпрессу по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка. По оз. Соленое контракт на 30 млн. руб. находится на согласовании.

4. Принять к сведению информацию начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа Сазонтовой И.П. о существенном снижении цены (порядка 2,8 млн. руб.) по двум аукционам: «Видовая площадка № 2» и Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру». Экономии предлагают перераспределить на сквер «Молодежный» – 400 тыс. руб., на сквер «Школьный» (обустройство подходов к скверу) – 2,3 млн руб.

5. Руководителям структурных подразделений (Мухамадиева Е.А., Шевченко А.В., Арапов О.В., Ольшевская Т.В., Рой К.Е., Сазонтова И.П., Устинов А.И.):

5.1. до **15.03.2023** завершить контрактацию по лимитам 2023 года мероприятий, предусмотренных национальными проектами, проектами инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»;

5.2. до **01.04.2023** завершить контрактацию по лимитам 2023 года мероприятий плана социального развития центров экономического роста Находкинского городского округа;

5.3. обеспечить кассовое исполнение мероприятий плана социального развития центров экономического роста:

– на **01.04.2023** – 25 %;

– на **01.07.2023** – 50 %;

– на **01.10.2023** – 75 %;

– на **15.12.2023** – 100 %;

5.4. еженедельно по пятницам до **12:00** предоставлять в управление финансов администрации Находкинского городского округа актуальную расшифровку бюджетных ассигнований Находкинского городского округа (по объектам), запланированных на 2023 год на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию (в том числе проектно-изыскательские работы, разработку проектно-сметной документации). Предоставляемая информация должна включать расшифровку расходов, направленных на развитие инфраструктуры Находкинского городского округа (включая мероприятия согласно долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития Находкинского городского округа Приморского края, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 16 июня 2022 № 1580-р);

5.5. на **01 и 15** число месяца, а также по мере заключения контрактов оперативно предоставлять сведения о контрактации в управление экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа для подготовки сводного ответа в Прокуратуру г. Находка;

5.6. оперативно доводить информацию о рисках нарушения сроков контрактации, об изменениях кассового плана управлению финансов администрации Находкинского городского округа и управлению экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;

5.7. организовать работу с иногородними подрядчиками по открытию на территории Находкинского городского округа обособленных подразделений;

5.8. провести разъяснительную работу с подрядчиками по вопросу поддержания среднего уровня заработной платы, который сложился по отрасли.

6. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) направить в управление экономики и инвестиций Находкинского городского округа информацию об открытии обособленного подразделения на территории Находкинского городского округа подрядчиком, выполняющим работы по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка.

---

#### 4. О достижении показателя «Уровень оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления»

---

Якименко Л.А., Шевченко А.В., Подгорный С.А., Сазонтова И.П., Рой К.Е., Браташ Д.М.

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Находкинского городского округа Якименко Л.А. об уровне удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Находкинского городского округа (74,5 %), организаций транспортного обслуживания (47,3 %); качеством автомобильных дорог (49,4 %), качеством работы ЖКХ (92 %), качеством услуг теплоснабжения (81 %), качеством услуг водоснабжения (98 %), качеством услуг электроснабжения (97 %).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа (Шевченко А.В.) организовать на ежеквартальной основе мониторинг удовлетворенности жителей Находкинского городского округа качеством услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель главы администрации  
Находкинского городского округа



Л.А. Якименко

Секретарь



С.О. Свиридова

**СПИСОК****заседания Проектного комитета  
Находкинского городского округа****02.03.2023****11:00**

1. **ЯКИМЕНКО**  
Лариса Александровна - заместитель главы администрации НГО
2. **БРАТАШ**  
Денис Михайлович - заместитель главы администрации НГО - начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО;
3. **ПОДГОРНЫЙ**  
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;
4. **ШЕВЧЕНКО**  
Антон Владимирович - заместитель главы администрации НГО - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО;
5. **СОЛОВЕЙ**  
Елена Аркадьевна - заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО;
6. **КОЗОРЕЗ**  
Руслан Владимирович - заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в социальной сфере;
7. **ВОРОНИНА**  
Александра Анатольевна - начальник финансового управления администрации НГО;
8. **ЛЁЛИН**  
Игорь Валерьевич - директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ»;
9. **РОЙ**  
Константин Евгеньевич - директор МКУ «Управление городским хозяйством»;
10. **САЗОНТОВА**  
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства администрации НГО;

11. **МАРЧЕНКО**  
Екатерина  
Александровна - директор МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО»;
12. **ОЛЬШЕВСКАЯ**  
Татьяна Васильевна - начальник управления культуры администрации НГО;
13. **САИДБАЕВА**  
Ольга Геннадьевна - заместитель директора МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры НГО»;
14. **ЩИТОВ**  
Денис Андреевич - заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства»;
15. **КУЛЬПИН**  
Сергей Александрович - заместитель директора МКУ «Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»;
16. **ЗУБКОВА**  
Татьяна Николаевна - начальник департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства;
17. **СВИРИДОВА**  
Светлана Олеговна - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства.



ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ

НАХОДКА



# Финансирование национальных проектов в 2022 году

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб	% исполнения
<b>ИТОГО, в том числе за счет средств:</b>	<b>86 309 065,03</b>	<b>86 309 064,74</b>	<b>100,00</b>
федерального бюджета	59 805 813,66	59 805 813,66	100,00
краевого бюджета	22 717 184,12	22 717 184,12	100,00
местного бюджета	3 786 067,25	3 786 067,25	100,00

# Национальный проект «Демография»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
<b>Региональный проект «Спорт - норма жизни»,</b> в том числе за счет средств:	<b>3 358 000,00</b>	<b>3 358 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>краевого бюджета</i>	<i>2 109 749,97</i>	<i>2 109 749,97</i>	<i>100,00</i>
<i>местного бюджета</i>	<i>1 248 250,03</i>	<i>1 248 250,03</i>	<i>100,00</i>
<b>Поставка спортивных товаров, поставка модуля «Прокат с раздевалкой» на базе 40-футового контейнера в МАУ СШ «Ливадия» НГО</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Поставка лыж беговых, креплений, палок к беговым лыжам, лыжных ботинок, коньков хоккейных, палок для скандинавской ходьбы, 2 модулей «Прокат с раздевалкой» на базе 40-футового контейнера в МАУ «Физкультура и здоровье» НГО</b>	<b>2 353 000,00</b>	<b>2 353 000,00</b>	<b>100,00</b>



# Национальный проект «Образование»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
Региональный проект «Современная школа», в том числе за счет средств:	16 709 152,71	16 709 152,71	100,00
<i>краевого бюджета</i>	<i>16 709 152,71</i>	<i>16 709 152,71</i>	<i>100,00</i>
<b>В соответствии с Законом Приморского края от 23.11.2018 №389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых, государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края» молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений Находкинского городского округа предоставляются следующие виды социальной поддержки: единовременная денежная выплата молодым специалистам, ежемесячная денежная выплата молодым специалистам, компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения, компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение. Также в соответствии с указанным выше законом предоставляется мера социальной поддержки наставникам молодых специалистов в виде ежемесячной денежной выплаты.</b>	16 709 152,71	16 709 152,71	100,00

# Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
<b>Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе за счет средств:</b>	<b>47 404 874,69</b>	<b>47 404 874,40</b>	<b>100,00</b>
<i>федерального бюджета</i>	44 060 616,44	44 060 616,44	100,00
<i>краевого бюджета</i>	899 196,25	899 196,25	100,00
<i>местного бюджета</i>	2 445 062,00	2 445 857,42	100,00
<b>Проведение негосударственной экспертизы объекта «Сквер Школьный»</b>	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>Выполнение работ по разработке проектной документации благоустройства объектов: «Видовая площадка № 2», «Видовая площадка № 3», сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру»</b>	500 883,00	500 883,00	100,00
<b>Проведение негосударственной экспертизы сметной документации (объект «Благоустройство территории общего пользования сквера «Русь», 2 этап)</b>	20 250,00	20 250,00	100,00
<b>Выполнение работ по благоустройству сквера в районе стелы Совершеннолетия - монумента в честь преобразования поселка в город</b>	1 690 000,29	1 690 000,00	100,00

# Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
Выполнение работ по благоустройству территории сквера «Озерный бульвар»	14 587 769,53	14 587 769,53	100,00




# Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
Комплексное благоустройство территории сквера мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945гг.	11 063 762,14	11 063 762,14	100,00



# Национальный проект «Жилье и городская среда»

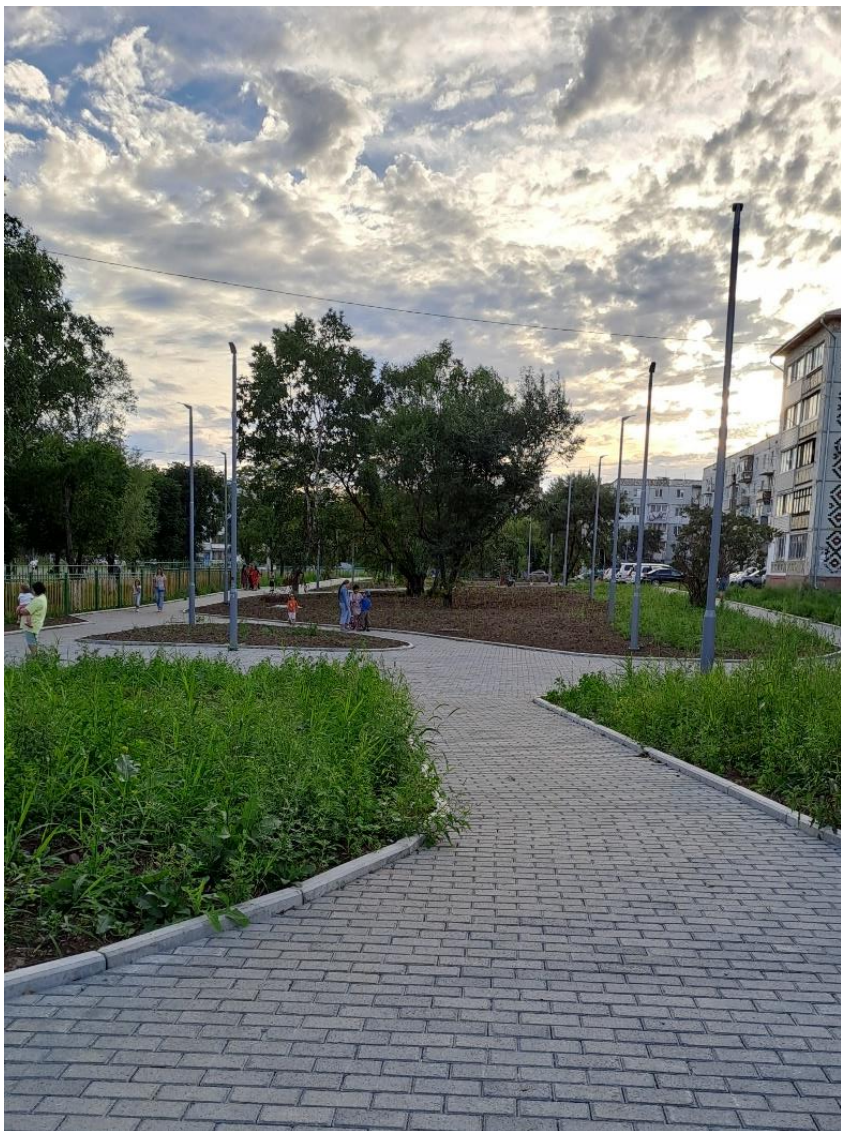

	<b>Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.</b>	<b>Исполнено за 2022 год, руб.</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Выполнение работ по благоустройству объекта «Сквер Школьный»</b>	13 992 446,23	13 992 446,23	100,00

# Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
Выполнение работ по благоустройству объекта «Видовая площадка № 1»	5 541 763,50	5 541 763,50	100,00



# Национальный проект «Культура»

	Утвержденные бюджетные назначения 2022 года, руб.	Исполнено за 2022 год, руб.	% исполнения
<b>Региональный проект «Культурная среда», в том числе за счет средств:</b>	<b>18 837 037,63</b>	<b>18 837 037,63</b>	<b>100,00</b>
<i>федерального бюджета</i>	<i>15 745 197,22</i>	<i>15 745 197,22</i>	<i>100,00</i>
<i>краевого бюджета</i>	<i>2 999 085,19</i>	<i>2 999 085,19</i>	<i>100,00</i>
<i>местного бюджета</i>	<i>92 755,22</i>	<i>92 755,22</i>	<i>100,00</i>
<b>Капитальный ремонт классов, коридоров, концертного зала, системы электрооборудования и электроосвещения, участков фасада здания, устройство изоляции перегородок классов в МБУДО «Городская детская хоровая школа» НГО</b>	<b>16 216 542,79</b>	<b>16 216 542,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Капитальный ремонт классов, крыши, внутренней системы отопления в МБУДО «Детская школа искусств №4» НГО</b>	<b>2 620 494,84</b>	<b>2 620 494,84</b>	<b>100,00</b>






# О достижении показателей и результатов региональных (муниципальных) проектов 2022 года




# Итоги реализации региональных проектов в 2022 году



## Показатели



## Результаты

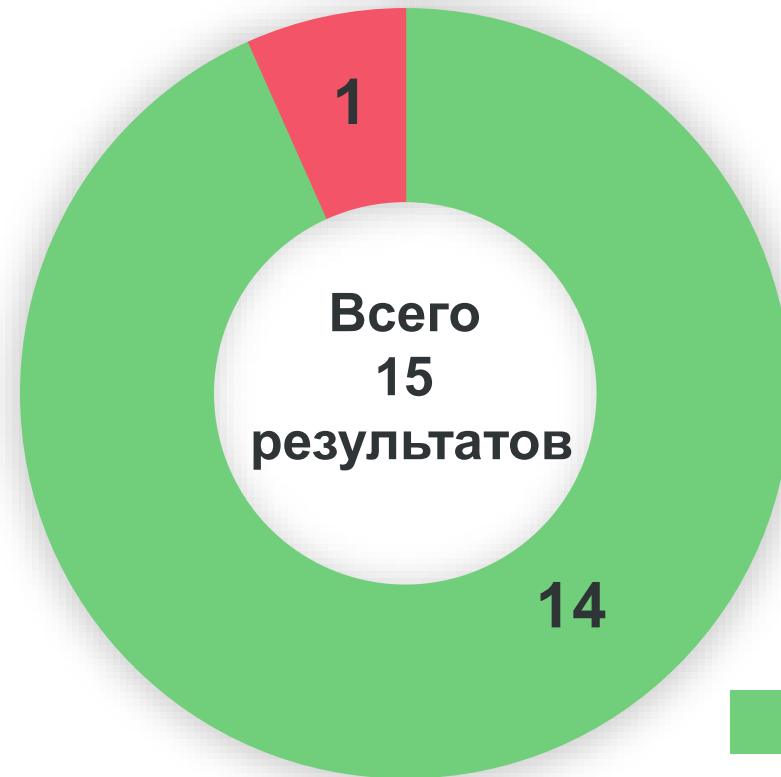


Выполнено

Нет данных

Не выполнено


# Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», %	4,53	7,9
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %	30	542
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, чел.	14 838	17 479
Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей, ед.	1	1

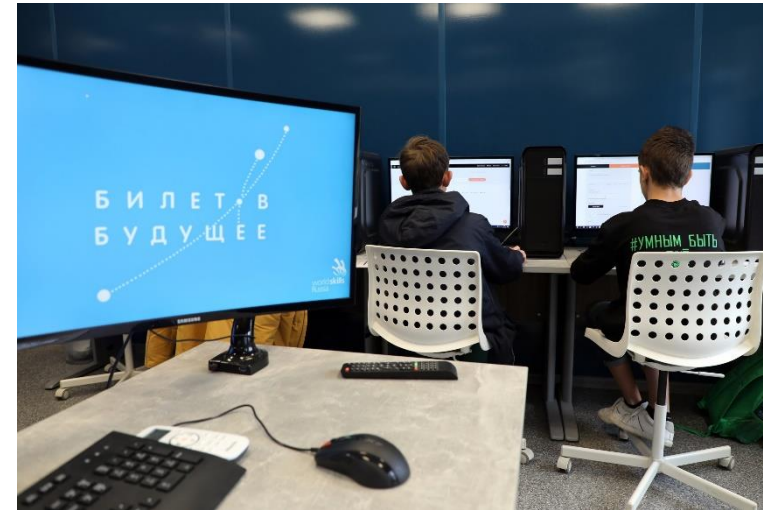

# Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, чел.	11 640	64 730
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающий итог), чел.	268	490
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, ед.	15	15



# Региональный проект «Патриотическое воспитание»



Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (нарастающим итогом) , ед.	25	25
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими Проектами, чел.	9 870	17 121
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, чел.	582	1 126



# Региональный проект «Цифровая образовательная среда»



Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	10	19,5
Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, %	10	70
Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, %	10	100



Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом), ед.	1	1






Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.	4 188	6 620

# Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, %	49,57	49,96
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	45	44,68
Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
В организации спортивной направленности поставлено оборудование и инвентарь для развития массового спорта, ед. - МАУ «ФиЗ» НГО, - МАУ СШ «Ливадия» НГО.	2	2



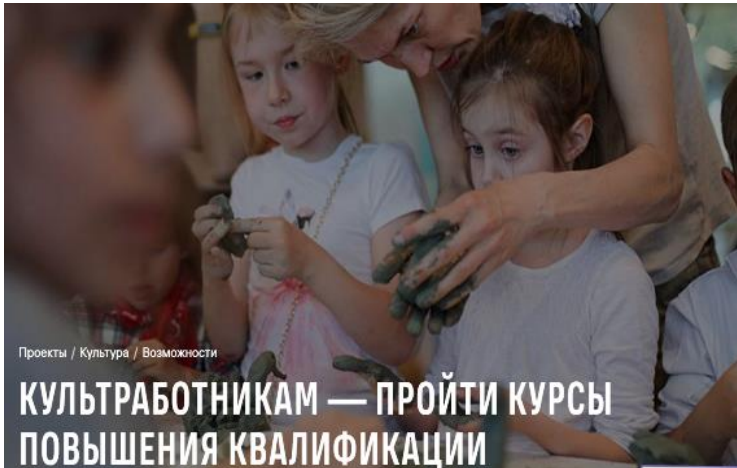

Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров (нарастающим итогом), чел.	108	108
Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Организовано участие творческих и управленческих кадров отрасли культуры в программах повышения квалификации (профессиональная переподготовка) на базе созданных Центров непрерывного образования и повышения квалификации, чел.	44	44
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	50	611

# Региональный проект «Культурная среда»



Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), ед.	3	3

Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
<p>Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 2 детские школы искусств по видам искусств, ед.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ № 4»;</li> <li>- капитальный ремонт здания МБУ ДО «ГДХШ» НГО.</li> </ul>	2	2

Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Количество благоустроенных общественных территорий (ежегодно), ед.	4 (скорректировано до 7)	7
Индекс качества городской среды, балл	184	данные будут в апреле 2023 года
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %	90	90
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	20	20



Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
<p>Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сквер Озерный бульвар (2 этап);</li> <li>- Сквер мемориального комплекса жителям села Козьино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (2 этап);</li> <li>- сквер Школьный;</li> <li>- Видовая площадка № 1.</li> </ul>	4	4
<p>Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, <b>за счет иных внебюджетных источников, а также средств местного бюджета</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пляж «Коровий»;</li> <li>- сквер дружбы России и Армении;</li> <li>- сквер в районе стелы Совершеннолетия-монумента в честь преобразования поселка в город.</li> </ul>	3	3
<p>Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», %</p>	20	20



# Региональный проект «Жилье»



Показатель/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Объем жилищного строительства, кв. м.	70 000	66 339
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га.	0,0041	0,00575

Результат/Индикатор	План на 2022 год	Факт за 2022 год
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации, кв. м.	70 000	66 339
