

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

16 августа 2023 года

15:00 ч.

Председатель – глава Находкинского городского округа Т.В. Магинский.

Присутствовали: 28 человек. *Приложение №1.*

1. Награждение общественного наблюдателя Находкинского городского округа Тен М.К. благодарственным письмом Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко за активную позицию и вклад в развитие Приморского края.

2. О назначении координатора общественных наблюдателей и формировании графика выездов на сентябрь 2023 года.

2.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации НГО МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Гринько Н.О. о назначении координатора общественных наблюдателей в 2023 году. *Приложение № 2.*

2.2. Руководителям структурных подразделений (Сазонтовой И.П., Устинову А.И., Устиновой О.В., Шевченко А.В., Арапову О.В., Ольшевской Т.В., Щитову Д.А.) организовать работу по выездам общественных наблюдателей на объекты мониторинга в соответствии с графиком выездов на сентябрь 2023 года, по объектам инициативного бюджетирования «Твой проект» с обязательным приглашением инициаторов проектов. *Приложение №3.*

3. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов с 18.07.2023 года по 11.08.2023 года.

3.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и предпринимательства Гринько Н.О. о замечаниях общественных наблюдателей по объектам: сквер Молодежный, набережная в с. Анна, «Тропа здоровья», стадион в п. Ливадия. *Приложение № 4.*

3.2. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 27.07.2023 на объекте сквер Молодежный, расположенный по адресу: г. Находка, ул. Дзержинского, 1 по замене поврежденной решетки ливнепровода.

3.2.1. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на объекте сквер Молодежный, расположенный по адресу: г. Находка, ул. Дзержинского, 1 устранить поврежденные и установить новые решетки ливнепровода **в срок до 01.09.2023г**

3.3. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о пожеланиях жителей, выявленных в ходе выездной проверки 27.07.2023 на объект по благоустройству набережной, расположенной по адресу: с. Анна ул. Набережная о необходимости установки решеток на ливнепровода, для удобства и безопасности движения пешеходов.

3.4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 26.07.2023 на объект «Тропа здоровья», расположенный по адресу: г. Находка, ул. Ленинградская, 23. На момент выезда на объекте отсутствовали рабочие. Необходимо установить информационный щит о правилах пользования тропой. На входе на тропу, со стороны ул. Юбилейная, д. 8, находится щебень разных фракций, что делает спуск по тропе к основным объектам небезопасным и имеет неэстетический вид.

3.5. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) на объекте «Тропа здоровья», расположенном по адресу: г. Находка, ул. Ленинградская, 23 разработать и проконтролировать установку подрядчиком информационного щита о правилах пользования тропой. При входе на тропу, со стороны ул. Юбилейная, д. 8, проконтролировать работу подрядчика, по отсыпке щебня на недостающем участке тропы для обеспечения безопасности граждан,

усилить контроль за ежедневным количеством рабочих на объекте. **Срок исполнения 04.09.2023г**

3.6. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездной проверки 10.08.2023 на объект по благоустройству стадиона, расположенного по адресу: г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2А. При осмотре обнаружены дефекты бордюров и покрытия спортивной площадки. Необходимо доработать соединение полукруглой беговой дорожки с покрытием стадиона. Так же необходимо учесть, что при выпадении обильных осадков, дренажная система не справляется с водоотведением, что приводит к подтоплению части футбольного поля. Рекомендуется улучшить систему водоотведения.

3.7. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) обеспечить организацию водоотведения на футбольном поле. **Срок 15.09.2023г**

3.8. Принять к сведению информацию общественных наблюдателей о необходимости установки «умного» светофора в районе памятника Победы в Великой Отечественной войне, в виду увеличения посещаемости смотровых площадок, расположенных в районе от остановки Площадь Совершеннолетия до остановки Тихоокеанская.

3.9. Начальнику управления благоустройства администрации НГО Сазонтовой И.П. вынести на комиссию по безопасности дорожного движения вопрос об ограничении скоростного режима, установки «умного» светофора в районе пешеходного перехода между остановками Площадь Совершеннолетия и Тихоокеанская.

3.10. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя Нагина С.Ю. о разработке им проекта по созданию беговых и велосипедных дорожек, как элемента дорожной инфраструктуры.

3.11. Начальнику управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Арапову О.В. вынести «Проект по развитию велосипедной и беговой инфраструктуры в г. Находка» на следующее заседание Проектного комитета.

4. О ходе реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста, национальных проектов, инициативного бюджетирования «Твой проект» и программы благоустройства сельских поселений на 1 августа 2023 года.

4.1. Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО Соловей Е.А. довела до сведения, что обустройство стадиона в п. Ливадия подходит к завершению, объект будет сдан в срок.

4.2. Заместитель главы администрации НГО – начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия» Подгорный С.А. довел до сведения, что на детской площадке в с. Душкино подрядчиком заменены лавочки и урны (МАФ) в соответствии с требованием технического задания. Объект сдан.

4.3. Принять к сведению информацию Заместителя главы администрации НГО – начальника территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия» Подгорного С.А. о несвоевременной поставке гранитных бордюров для установки на площадке памятника жителям с. Душкино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Срок их установки перенесен на 31.08.2023г.

4.3.1. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) обеспечить завершение работ по проекту «Памятник жителям с. Душкино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» до **15.09.2023г**, обеспечить кассовое исполнение по данному проекту до **20.09.2023г**

4.3.2. Начальнику управления благоустройства Администрации НГО Сазонтовой И.П. обеспечить завершение работ по проекту «Обустройство ливневых стоков по ул. Набережная с. Анна НГО» по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в срок до **25.08.2023г**, обеспечить кассовое исполнение по проекту «Обустройство ливневых стоков по ул. Набережная с. Анна НГО» до **31.08.2023г**

4.4. Принять к сведению информацию главы Находкинского городского округа Магинского Т.В., что сроки сдачи Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) расположенного по адресу: г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя,

д. 30, по программе социального развития центров экономического роста, сдвигаются на 2024 год, в связи с несвоевременной поставкой металлоконструкций.

4.5. И.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» Устинову А.И., Начальнику управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО Арапову О.В, подготовить техническое задание и определить сметную стоимость установки освещения на стадионе «Водник», расположенном по адресу: г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56. **Срок исполнения 25.09.2023г**

4.6. Начальнику управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО Арапову О.В., Начальнику финансового управления Ворониной А.А. определить источник финансирования для разработки проектно-сметной документации на устройство освещения. **Срок исполнения 25.09.2023г**

4.7. Принять к сведению информацию и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства» Устинова А.И. об установке модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Находка, ул. Нахимовская, д. 21А, согласно утверждённого графика: установлена плита под модульный спортивный зал, металлокаркас, подрядчик занимается подключением электросетей. Риски отсутствуют.

5. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам социального развития центров экономического роста на 1 полугодие 2023 года.

5.1. Принять к сведению информацию заместителя начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа Мягих Е.С. по исполнению бюджета по состоянию на 01.08.2023 года: *Приложение №5.*

6. О достижении показателей и индикаторов Указа Президента РФ от 04.02.2021 года № 68 за 1 полугодие 2023 года.

6.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Гринько Н.О. о достижении показателей и индикаторов Указа Президента РФ от 04.02.2021 года № 68 за 1 полугодие 2023 года. *Приложение №6.*

6.2. Отделу по делам молодежи (Козорез Р.В.) предоставить информацию о численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность за 1 полугодие 2023 года.

6.3. Руководителям структурных подразделений (Мухамадиевой Е.А., Валевиц В.Н., Шевченко А.В., Сазонтовой И.П., Устинову А.И., Устиновой О.В., Арапову О.В., Ольшевской Т.В., Щитову Д.А.), отвечающим за показатели эффективности деятельности Губернатора и глав муниципалитетов по Указу Президента РФ от 04.02.2021 № 68, предоставить перечень мероприятий по достижению плановых показателей в 2023 году. **Срок исполнения 15.09.2023г**

Глава Находкинского городского округа

Т.В. Магинский

Секретарь Проектного комитета

Н.О. Гринько

СПИСОК
заседания Проектного комитета
Находкинского городского округа

16.08.2023

15:00

1. **МАГИНСКИЙ**
Тимур Владимирович - глава Находкинского городского округа;
2. **ЯКИМЕНКО**
Лариса Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа;
3. **ШЕВЧЕНКО**
Антон Владимирович - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа;
4. **МУХАМАДИЕВА**
Евгения Александровна - заместитель главы администрации Находкинского городского округа – начальник управления образования;
5. **ПОДГОРНЫЙ**
Сергей Алексеевич - заместитель главы администрации Находкинского городского округа - начальник территориального управления микрорайона города «поселок Ливадия»;
6. **МЯГКИХ**
Елена Сергеевна - и.о. начальника финансового управления администрации Находкинского городского округа;
7. **САЗОНТОВА**
Ирина Петровна - начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа;
8. **СОЛОВЕЙ**
Елена Аркадьевна - заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Находкинского городского округа;
9. **НОВИКОВА**
Елена Геннадьевна - начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа;

10. **АНИКИНА**
Наталья Александровна - заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и развития туризма администрации Находкинского городского округа;
11. **ОЛЬШЕВСКАЯ**
Татьяна Васильевна - начальник управления культуры Находкинского городского округа;
12. **ЖУРАВЛЕВА**
Анжелика Ивановна - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства;
13. **СЕДОВА**
Инна Евгеньевна - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства производственно-технического отдела жилищно-коммунального хозяйства;
14. **УСТИНОВ**
Алексей Иванович - и.о. директора МКУ «Управление капитального строительства»;
15. **ЩИТОВ**
Денис Андреевич - заместитель директора по экономике МКУ «Управление капитального строительства»;
16. **ГИЛЯКОВА**
Татьяна Сергеевна - заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО», заместитель руководителя проектного комитета;
17. **СЁМИНА**
Марина Александровна - начальник отдела экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа;
18. **ПЕТРОШЕНКО**
Кристина Алексеевна - заместитель начальника отдела экономики и инвестиций;
19. **ГРИНЬКО**
Наталья Олеговна - главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства;

20. **УСТИНОВА**
Ольга Валентиновна - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и средствам массовой информации;
21. **БЕЛОБОРОДОВА**
Юлия Валентиновна - общественный наблюдатель;
22. **ЛЕОНОВА**
Юлия Викторовна - общественный наблюдатель;
23. **КАРАПЕТЯН**
Карен Камоевич - общественный наблюдатель
24. **ЧИГРИНСКАЯ**
Наталья Викторовна - общественный наблюдатель;
25. **РАКАУСКАС**
Максим Ромуальдасович - общественный наблюдатель;
26. **ТЕН**
Маргарита
Константиновна - общественный наблюдатель;
27. **БОЛТЕНКОВ**
Вениамин
Александрович - общественный наблюдатель;
28. **НАГИН**
Сергей Юрьевич - общественный наблюдатель;
29. **КРУГЛИК**
Екатерина Андреевна - общественный наблюдатель;
30. **ПОДШИВАЛОВА**
Юлия Вячеславовна - общественный наблюдатель;
31. **ВАСИЛЬЕВА**
Глория Васильевна - общественный наблюдатель.



Об организации работы с общественными наблюдателями в 2023 году

году



Находкинский ГО

Общественный наблюдатель

- ✓ Активный, неравнодушный житель
- ✓ Возраст от 18 до 72 лет
- ✓ Имеет опыт соцпроектов
- ✓ Контролирует работы на объектах
- ✓ Взаимодействует с подрядчиками
- ✓ Выносит предложения
- ✓ Дает обратную связь органам власти





Гринько Наталья Олеговна

главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского ГО в сфере экономики и предпринимательства



8 (4236) 69-21-32




8-914-670-85-62



Проектный офис НГО



Проектный офис – орган, который отвечает за координацию и мониторинг проектной деятельности в администрации Находкинского городского округа.



WhatsApp

Проектное управление

Проектный офис

ФИО	Должность, роль	Контакты
Якименко Лариса Александровна	Заместитель главы администрации Находкинского городского округа, руководитель проектного офиса	тел.: +7 (4236) 69-21-03, E-mail: Yakimenko_LA@nakhodka-city.ru
Зубкова Татьяна Николаевна	Начальник департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО», заместитель руководителя проектного офиса	тел.: +7 (4236) 69-21-24, E-mail: TZubkova@nakhodka-city.ru
Петрошенко Кристина Алексеевна	Заместитель начальника отдела экономики и инвестиций управления экономики и инвестиций администрации Находкинского городского округа, администратор проектного офиса	тел.: +7 (4236) 69-20-11, E-mail: KPetroshenko@nakhodka-city.ru
Гринько Наталья Олеговна	Главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в сфере экономики и предпринимательства МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления НГО», сотрудник проектного офиса	тел.: +7 (4236) 69-21-32, E-mail: grinko_no@nakhodka-city.ru

- Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 11.04.2022 № 199-р О назначении координатора проектной деятельности в администрации Находкинского городского округа
- Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 12.04.2022 № 204-р О создании муниципального проектного офиса Находкинского городского округа
- Распоряжение администрации Находкинского городского округа от 26.04.2022 № 229-р О создании Проектного комитета Находкинского городского округа

- Институт общественных наблюдателей
- Национальные проекты

Найти в разделе...



Разделы

- Административная реформа
- Выявление правообладателя недвижимости
- Градостроительство
- Доступность для маломобильных групп населения
- Информация для граждан
- Контрольно-надзорная деятельность
- Международные отношения
- Муниципальная собственность
- Муниципальные закупки
- Муниципальные программы
- Муниципальные услуги
- Открытые данные
- Открытый бюджет
- Показатели эффективности деятельности
- Проектное управление**
- Противодействие коррупции


Официальный сайт Находкинского городского округа

Мониторинг за созданием государственных и муниципальных объектов 01.07.2023 – 31.07.2023



Мониторинг
за созданием
государственных и
муниципальных
объектов

01.07.2023 – 31.07.2023

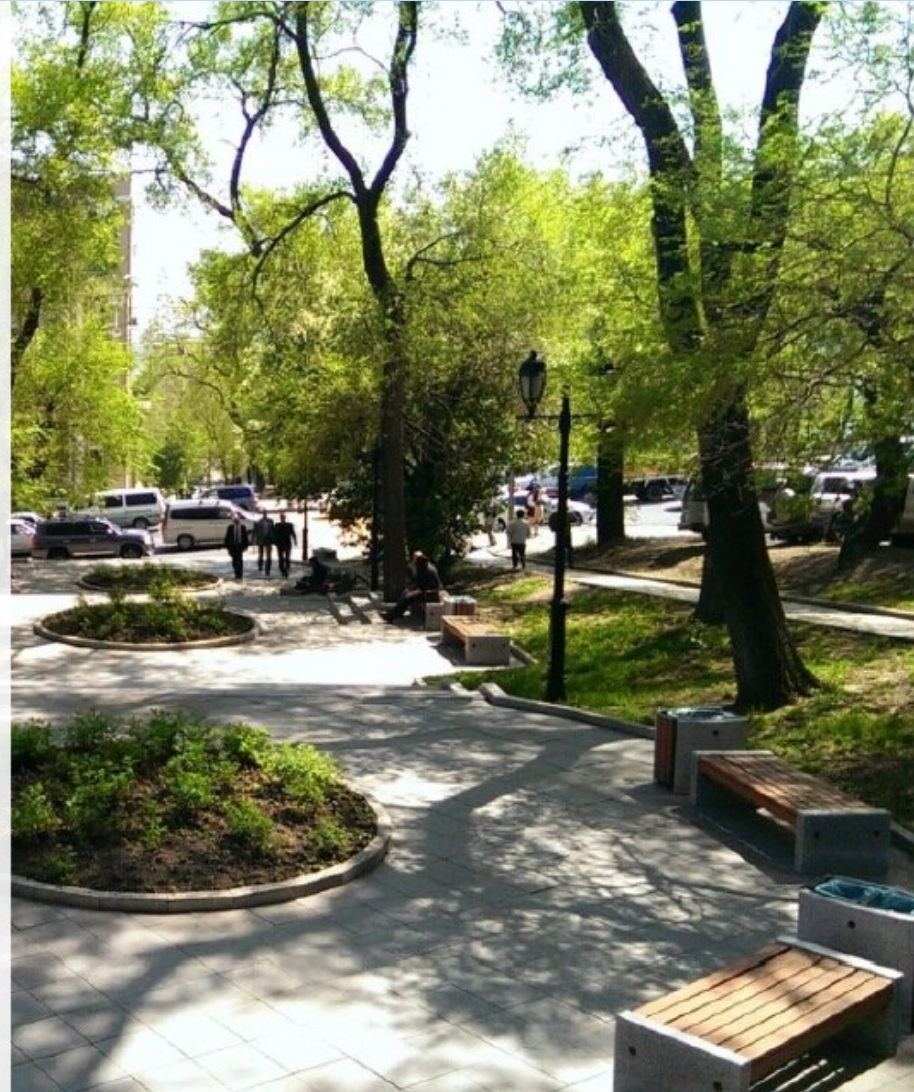

Активность муниципалитетов

Выезжали на объекты (27)

Анучинский округ	Пограничный округ
Арсеньев	Пожарский округ
Артём	Спасск-Дальний
Большой Камень	Спасский р-н
Владивосток	Тернейский округ
Дальнереченский р-н	Уссурийск
Кавалеровский округ	Ханкайский округ
Кировский р-н	Хасанский округ
Лазовский округ	Хорольский округ
Лесозаводский округ	Черниговский округ
Надеждинский р-н	Чугуевский округ
Находка	Шкотовский округ
Ольгинский округ	Яковлевский округ
Партизанск	

Не выезжали на объекты (7)

Дальнегорск
Дальнереченск
Красноармейский р-н
Михайловский р-н
Октябрьский округ
Партизанский район
Фокино



Количество чек-листов – 345

Количество МО - 28

Топ 5 МО по количеству заполненных чек-листов:

1. Артем
2. Находка
3. Спасск-Дальний
4. Партизанск
5. Шкотовский округ

Топ 5 Общественных наблюдателей по количеству заполненных чек-листов

1. Леонова Ю.В.
2. Белобородова Ю.В.
3. Подшивалова Ю.В.
4. Болтенков В.А.
5. Чигринская Н.В.

100% - выполнение работ по объектам ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Готовность объекта	Комментарии
1	Губернаторская программа "1000 дворов"	Ремонт внутридворового проезда	г. Находка, Кирова, д. 11	Седова Инна Евгеньевна - заместитель начальника производственно-технического отдела ЖКХ МКУ "Управление городским хозяйством"; Вострых Татьяна Геннадьевна - главный специалист производственно-технического отдела ЖКХ МКУ "Управление городским хозяйством"	100%	
2	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Комсомольская, д. 34		100%	
3	Губернаторская программа "1000 дворов"	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Куйбышева, д. 4В		100%	
4	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	г. Находка, ул. Дзержинского, 16 Б		100%	
5	Губернаторская программа "1000 дворов"	Ремонт внутридворового проезда	г. Находка, ул. Озерный бульвар, д.7		100%	
6	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, д. 36А		100%	
7	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пограничная, д. 36 Б		100%	
8	Губернаторская программа "1000 дворов"	Ремонт внутридворового проезда	г. Находка, ул. Черняховского, д. 1		100%	
9	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Нахимовская, д. 19		100%	
10	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Верхне-Морская, д. 106		100%	
11	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	г. Находка, ул. Пирогова, д. 28		100%	

100% - выполнение работ по объектам ИЮЛЬ 2023 г

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Готовность объекта	Комментарии
12	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Пирогова, д. 46	Седова Инна Евгеньевна - заместитель начальника производственно-технического отдела ЖКХ МКУ "Управление городским хозяйством"; Вострых Татьяна Геннадьевна - главный специалист производственно-технического отдела ЖКХ МКУ "Управление городским хозяйством"	100%	
13	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 6		100%	
14	Губернаторская программа "1000 дворов"	Спортивная площадка	г. Находка, ул. Рыбацкая, д. 17 В		100%	
15	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	г. Находка, ул. Арсеньева, д. 9		100%	
16	Губернаторская программа "1000 дворов"	Спортивная площадка	г. Находка, ул. Пирогова, д. 52		100%	
17	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Пушкинская, д. 1		100%	
18	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 14		100%	Имеются акты вандализма: сломана щеколда на входе на спортивную площадку.
19	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Восточный проспект, д. 6а		100%	
20	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Анна, ул. Набережная, д. 5		100%	
21	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Приморский проспект, д. 4		100%	
22	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Приморский проспект, д. 8	100%		




100% - выполнение работ по объектам ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Готовность объекта	Комментарии
23	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 11, д. 13	Седова Инна Евгеньевна - заместитель начальника производственно-технического отдела ЖКХ МКУ "Управление городским хозяйством"; Вострых Татьяна Геннадьевна - главный специалист производственно-технического отдела ЖКХ МКУ "Управление городским хозяйством"	100%	Жители жалуются на довольно яркий свет от фонарей, которые освещают площадку. Управляющей компанией не вывезены старые качели.
24	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, ул. Невельского, д.2		100%	
25	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство дворовой территории	п. Врангель, Приморский проспект, д. 2		100%	
26	Национальный проект "Формирование комфортной среды (ФКГС)"	Видовая площадка № 2	г. Находка, примерно в 90 м по направлению на с-в от ориентира (жилой дом по ул. Водолазная, д.10)		100%	
27	Губернаторская программа "1000 дворов"	Детская площадка	п. Врангель, ул. Внутрипортовая, д. 11, д. 13		Попова Александра Игоревна - заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством"	100%
28	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт кровли и внутренних помещений МАУК «ЛДК» НГО с/п «Клуб села Анна»	п. Анна, ул. Нагорная 1	Устинова Ольга Валентиновна - начальник отдела по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и СМИ	100%	



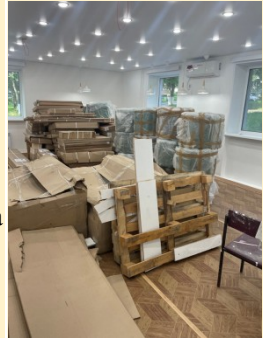

Закрывающиеся объекты ИЮЛЬ - АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Общественный наблюдатели	Готовность объекта	Комментарии	Фотоотчет
1	Национальный проект "Формирование комфортной среды (ФКГС)"	Сквер Школьный, 2 этап	г. Находка, ул. Постышева д.43	Копцов Яков Юрьевич - инженер по строительному контролю 2 категории производственно-технического отдела, МКУ ""Управление капитального строительства""	Белобородова Ю. В.; Леонова Ю.В.; Подшивалова Ю.В.	99% на 27.07.2023	Прочная сетка, надежно установлена. Внутри уже скопление пластиковых бутылок и мусора. На площадке имеются акты вандализма.	
2	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"	Сквер Молодежный	г. Находка ул. Дзержинского, д.1		Белобородова Ю.В.; Леонова Ю.В.; Подшивалова Ю.В.	99% на 27.07.2023	Установлены камеры видеонаблюдения. Выполнено ограждение спортивных площадок на 100 %. Требуется замена поврежденной решетки ливнестока.	
3	Благоустройство набережной в п. Анна	Благоустройство набережной	п. Анна, ул. Набережной	Устинова Ольга Валентиновна, начальник отдела деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и СМИ МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО»	Леонова Ю.В.	99% на 27.07.2023	Для удобства и безопасности движения пешеходов необходима укладка решеток ливнестока.	

Закрывающиеся объекты ИЮЛЬ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Общественный наблюдатели	Готовность объекта	Комментарии	Фотоотчет
4	Национальный проект "Культура"	Проведение работ по текущему ремонту МБУК "Центральная библиотечная система" НГО Центральная детская и юношеская библиотека по ул. Дзержинского 12	г. Находка, ул. Дзержинского, д. 12	Скуратовская Наталья Вячеславовна – заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности АНГО в социальной сфере; Бурлакова Ольга Николаевна – заместитель директора МКУ «ЦБМУК» НГО 8 (4236) 69-98-55		95% на 18.07.2023	Окрашены стены, установлен потолок Амстронг, выведены места под розетки, текущий ремонт помещений завершен. В рамках реализации мероприятия по созданию модельных библиотек, планируется оснащение программным обеспечением книжной продукцией, установка мебели по индивидуальному заказу. Дата открытия библиотеки 2 сентября 2023г.	
5	Губернаторская программа "1000 дворов"	Благоустройство дворовой территории	п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, д. 14.	Седова Инна Евгеньевна - заместитель начальника производственного–технического отдела ЖКХ МКУ «Управление городским хозяйством»	Белобородова Ю.В.	97% на 14.07.2023	Работы на данном объекте выполнены на 97% Осталось установить поручень для инвалидов.	
6	Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»	Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру»	г. Находка, примерно в 250 метров от направления на северо-восток от ориентира жилой дом ул. Седова, д.2		Васильева Г.В.	(85% на 31.07.2023) 90% на 14.08.2023	Выполнена работа по укладке покрытия из гальки вокруг «Камня дружбы», частично уложена брусчатка, ливнестоки закрыли специальными решетками, забетонировали основание и конструкцию под большой качелей, уложили брусчатку, установлены фонари освещения.	

Объекты в процессе работы ИЮЛЬ - АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Общественный наблюдатели	Готовность объекта	Комментарии	Фотоотчет
1	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт помещений здания, фасада здания, цокольного этажа МБУ ДО "ДШИ № 1" НГО	г. Находка, ул. Владивостокская, д. 12	Башмакова Марина Леонидовна – главный специалист департамента по обеспечению деятельности АНГО в социальной сфере 8 (4236) 69-91-83;	Подшивалова Ю.В.; Леонова Ю. В.; Чигиринская Н.В.	1-й контракт - 70%; 2-ой контракт 45% на 01.08.2023	По 1-му контракту в большей части помещений ремонт окончен: новый потолок, дверные проемы и двери, пол (линолеум), стены покрашены на несколько раз. По 2-му контракту: ведутся работы по полному демонтажу помещений и дверных проемов.	
2	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт внутренних помещений МБУ ДО "ДШИ № 5" НГО	п. Врангель, ул. Невельского, д. 2	Бурлакова Ольга Николаевна – заместитель директора МКУ «ЦБМУК» НГО 8 (4236) 69-98-55	Белобородова Ю. В.; Васильева Г. В.; Подшивалова Ю.В.; Болтенков В.А.	55% на 03.08.2023	Работы в правом крыле завершены. Начаты работы в левом крыле: демонтированы полы, выравнивание стен, демонтаж межкомнатных дверей.	
3	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних помещений здания МБУК "Театра кукол им. Г.С. Анисимова" НГО	г. Находка, ул. Находкинский проспект, д. 32	Скуратовская Наталья Вячеславовна – заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности АНГО в социальной сфере	Леонова Ю. В.; Тен М. К.; Карапетян К. К.; Васильева Г. В.	(56% на 19.07.2023) 59% на 01.08.2023	Выполнено окрашивание наружных стен. Производится укладка керамогранита. Внутри здания установлены леса, производится внутренняя отделка здания. Ведется работа с проводкой. Продолжаются работы по замене системы отопления.	
4	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт помещений и части фасада МБУК "ГКГ" Вернисаж" НГО	г. Находка, ул. Находкинский проспект, д. 22	Скуратовская Наталья Вячеславовна – заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности АНГО в социальной сфере	Леонова Ю.В.; Карапетян К.К.; Чигиринская Н.В.; Подшивалова Ю.В.	75% на 01.08.2023	Фасад покрыт декоративной штукатуркой на основе мраморной крошки. В выставочном зале произведено окрашивание стен на первый слой в выставочном зале. Во втором выставочном зале стены подготовлены под окрашивание.	

Объекты в процессе работы ИЮЛЬ - АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Общественный наблюдатели	Готовность объекта	Комментарии	Фотоотчет
5	Инициативное бюджетирование «Твой проект»	Тропа здоровья	г. Находка, ул. Ленинградская, д. 23 (примерно в 25 метрах)	Устинова Ольга Валентиновна, начальник отдела деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и СМИ МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО»	Леонова Ю.В.	60% на 26.07.2023 (10.08.2023 – выезд перенесен из-за погодных условий)	На объекте выполнена подготовка оснований под спортивные площадки. Продолжается монтаж спортивных объектов. Для большего удобства и улучшения эстетического вида, предлагаю заменить щебень разных фракций на входе на тропу со стороны ул. Юбилейной 8 на другое покрытие.	
6	Инициативное бюджетирование «Твой проект»	Обустройство стадиона п. Южно-Морской	мкп. п. Ливадия, ул. Комсомольская, 2А	Копцов Яков Юрьевич – инженер по строительному контролю 2 категории ПТО, МКУ «Управление капитального строительства» НГО	Леонова Ю.В.	(30% на 26.07.2023) 70% на 10.08.2023	При осмотре обнаружены дефекты бордюра и покрытия спортивной площадки. Необходимо доработать соединение беговой дорожки в кривой. В связи с обилием осадков дренажная система не справляется с водоотведением, что привело к подтоплению части футбольного поля. Рекомендую улучшить систему водоотведения. На объекте присутствует строительный мусор.	 
7	План социального развития центров экономического роста	Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник»	г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56	Копцов Яков Юрьевич – инженер по строительному контролю 2 категории ПТО, МКУ «Управление капитального строительства» НГО	Чигринская Н.В.; Карапетян К.К.	(45% на 26.07.2023) 55% на 10.08.2023	На легкоатлетической (малой) беговой дорожке ведутся работы по демонтажу старого асфальтового покрытия, уплотнение щебнем. Ведутся работы по бетонированию бордюра в обойме. Лоток выставлен на 100%. Устанавливаются решётки.	

Объекты в процессе работы ИЮЛЬ - АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес	Ответственные исполнители	Общественный наблюдатели	Готовность объекта	Комментарии	Фотоотчет
8	План социального развития центров экономического роста	Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)	г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя, д. 30	Покумейко Мария Александровна – инженер по строительному контролю 1 категории ПТО МКУ «Управление капитального строительства»	Белобородова Ю.В.; Леонова Ю.В.; Ракаускас М.Р.	40% на 27.07.2023 (10.08.2023 – выезд перенесен из-за погодных условий)	Активно ведутся работы. Паспорт объекта размещен. Ограждение установлено. Строительный мусор отсутствует. Замечаний и недочетов не выявлено.	
9	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство прилегающей территории вокруг оз. Соленое в г. Находка, этап 1.1	г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта мира	Копцов Яков Юрьевич – инженер по строительному контролю 2 категории ПТО, МКУ «Управление капитального строительства» НГО	Васильева Г.В.	55% на 11.08.2023	Работы ведутся очень активно. На каждом секторе объекта присутствуют рабочие. В зоне отдыха (пергола) установлены столбы и сверху установлен каркас. На площадке под сцену уложена гидроизоляция для лучшей эксплуатации в дальнейшем бетонного покрытия, исключения влаги в нем и под ним. Установка МАФов на одной из детских площадок. Установлены батуты и фонари на территории объекта.	 

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА В НАХОДКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Дата выезда на объект	Время выезда на объект	Наименование программы	Наименование объекта	Адрес месторасположения объекта	Ответственный исполнитель (сотрудник, с которым будет осуществляться выезд на объект)	Ответственные наблюдатели (выезжающие на объект) Ф.И.О.
01.09.	9:00	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство прилегающей территории вокруг оз.Соленое в г.Находка. Этап 1.1	г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира	Копцов Яков Юрьевич, инженер по строительному контролю 2 категории производственно-технического отдела, МКУ "УКС" НГО, 8 (4236) 64-03-05	Яшкина Анна Анатольевна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.)
05.09.	10:00 (на объекте)	Инициативное бюджетирование "Твой проект"	Обустройство стадиона п.Южно-Морской	г. Находка, мкр.п.Ливадия, ул. Комсомольская, 2А	Устинова Ольга Валентиновна, начальник отдела деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и СМИ МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО» 69-94-35,	Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.)
	14:30	Инициативное бюджетирование "Твой проект"	Тропа здоровья	г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно в 25 м)	Панов Андрей Владимирович, Инженер по строительному контролю 1 категории производственно-технического отдела МКУ "УКС" НГО 8 (4236) 64-03-05	Васильева Глория Васильевна (самост.) Яшкина Анна Анатольевна (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.) Ракаускас Максим Ромуальдасович (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
07.09.	9:00	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт помещений и части фасада МБУК «ГКГ» Вернисаж» г.Находка	г.Находка, Находкинский пр-т, 22	Башмакова Марина Леонидовна, главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере, 69-91-82	Васильева Глория Васильевна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Карапетян Карен Камосевич (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
	9:30	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних помещений здания МБУК «Театр кукол им. Г.С Анисимова» НГО ул. Находкинский пр-кт, 32	г. Находка ул. Находкинский пр-кт, 32	Бурлакова Ольга Николаевна, Заместитель директора МКУ "ЦБМУК" НГО, 8 (4236) 69-98-55	Васильева Глория Васильевна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Карапетян Карен Камосевич (самост.) Ракаускас Максим Ромуальдасович (транспорт) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
	10:00	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт помещений здания, фасада здания, цокольного этажа МБУ ДО «ДШИ № 1» НГО	г. Находка, ул. Владивостокская, 12		Васильева Глория Васильевна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Карапетян Карен Камосевич (самост.) Ракаускас Максим Ромуальдасович (транспорт) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
08.09.	9:00	План социального развития центров экономического роста	Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник» по ул. Владивостокская, 56 в г. Находка	г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56	Арапов Олег Васильевич, начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи, 8 (4236) 69-20-81, Копцов Яков Юрьевич, инженер по строительному контролю 2 категории ПТО , МКУ "УКС" НГО, 8	Тен Маргарита Константиновна (самост.) Яшкина Анна Анатольевна (самост.) Карапетян Карен Камосевич (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
	14:00	План социального развития центров экономического роста	Приобретение и установка модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2»	г. Находка, улица Нахимовская 21-а	Покумейко Мария Александровна, Инженер по строительному контролю 1 категории производственно-технического отдела МКУ "Управление капитального строительства", 8 (4236) 64-03-05	Тен Маргарита Константиновна (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
08.09.	15:00	План социального развития центров экономического роста	Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)	г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя, 30		Тен Маргарита Константиновна (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.) Ракаускас Максим Ромуальдасович (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
11.09.	9:00	Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»	Сквер в районе "Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру" (доп. работы в рамках экономии)	(Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м от направления на северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова, 2	Попова Александра Игоревна, заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством", 8 (4236) 69-82-02	Яшкина Анна Анатольевна (самостоятельно) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
	9:00	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт внутренних помещений МБУДО "Детская школа искусств № 5" НГО	г. Находка, п. Врангель ул. Невельского, 2	Башмакова Марина Леонидовна, главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере, 8 (4236) 69-91-83 Бурлакова Ольга Николаевна, Заместитель директора МКУ "ЦБМУК" НГО, 8 (4236) 69-98-55	Васильева Глория Васильевна (транспорт)

15.09.	9:00	План социального развития центров экономического роста	Благоустройство прилегающей территории вокруг оз. Солёное в г.Находка. Этап 1.1	г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира	Копцов Яков Юрьевич, инженер по строительному контролю 2 категории производственно-технического отдела, МКУ "УКС" НГО, 8 (4236) 64-03-05	Васильева Глория Васильевна (самост.) Тен Мargarита Константиновна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самостоятельно) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
19.09.	10:00 (на объекте)	Инициативное бюджетирование "Твой проект"	Обустройство стадиона п.Южно-Морской	г. Находка, мкр.п.Ливадия, ул. Комсомольская, 2А	Устинова Ольга Валентиновна, начальник отдела деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и СМИ МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО», 8 (4236) 69-94-35 Панов Андрей Владимирович, Инженер по строительному контролю 1 категории производственно-технического отдела МКУ "УКС" НГО, 8 (4236) 64-03-05	Леонова Юлия Викторовна (самост.)
19.09.	14:30	Инициативное бюджетирование "Твой проект"	Тропа здоровья	г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно в 25 м)	Устинова Ольга Валентиновна, начальник отдела деятельности администрации НГО в сфере общественного самоуправления департамента по связям с общественностью и СМИ МКУ «Управление по обеспечению деятельности ОМС НГО», 8 (4236) 69-94-35 Панов Андрей Владимирович, Инженер по строительному контролю 1 категории производственно-технического отдела МКУ	Васильева Глория Васильевна (самост.) Болтенков Вениамин Александрович (транспорт) Ракаукас Максим Ромуальдасович (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.)
22.09.	9:00	План социального развития центров экономического роста	Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник» по ул. Владивостокская, 56 в г. Находка	г. Находка, ул. Владивостокская, д. 56	Арапов Олег Васильевич, начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи, 8 (4236) 69-20-81 Копцов Яков Юрьевич, инженер по строительному контролю 2 категории ПТО, МКУ "УКС" НГО, 8 (4236) 64-03-05	Васильева Глория Васильевна (самост.) Тен Мargarита Константиновна (самост.) Карапетян Карен Камоевич (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.)
	14:00	План социального развития центров экономического роста	Приобретение и установка модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2»	г. Находка, улица Нахимовская 21-а	Покумейко Мария Александровна, Инженер по строительному контролю 1 категории производственно-технического отдела МКУ "Управление капитального строительства", 8 (4236) 64-03-05	Васильева Глория Васильевна (самост.) Тен Мargarита Константиновна (самост.) Болтенков Вениамин Александрович (транспорт) Карапетян Карен Камоевич (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.)
	15:00	План социального развития центров экономического роста	Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК)	г. Находка, 25 метров от ул. Дальняя, 30	Покумейко Мария Александровна, Инженер по строительному контролю 1 категории ПТО МКУ "Управление капитального строительства", 8 (4236) 64-03-05	Васильева Глория Васильевна (самост.) Тен Мargarита Константиновна (самост.) Яшкина Анна Анатольевна (самост.) Карапетян Карен Камоевич (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самостоятельно) Ракаукас Максим Ромуальдасович (самост.)
25.09.	9:00	Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»	Сквер в районе "Камень дружбы породненных городов Находка-Майзур" (доп. работы в рамках экономии)	(Приморский край, г. Находка, примерно в 250 м от направления на северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова, 2	Попова Александра Игоревна, заместитель директора МКУ "Управление городским хозяйством", 8 (4236) 69-82-02	Васильева Глория Васильевна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.)
28.09.	9:00	Национальный проект "Культура"	Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних помещений здания МБУК «Театр кукол им. Г.С Анисимова» НГО ул.	г. Находка ул. Находкинский пр-кт, 32	Башмакова Марина Леонидовна, главный специалист департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере, 8 (4236) 69-91-83	Васильева Глория Васильевна (самост.) Подшивалова Юлия Вячеславовна (самост.) Карапетян Карен Камоевич (самост.) Нагин Сергей Юрьевич (самост.) Леонова Юлия Викторовна (самост.) Белобородова Юлия Валентиновна (самост.)
		Национальный проект "Культура"	Проведение работ по текущему ремонту МБУК "Центральная библиотечная система" Находкинского городского округа детская библиотека №10	г.Находка, ул. Юбилейная 8	Скуратовская Наталья Вячеславовна, заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности администрации Находкинского городского округа в социальной сфере, 8 (4236) 69-91-80	Идёт уточнение по датам и времени открытия библиотек, ориентировочно на 01.09.2023
		Национальный проект "Культура"	Проведение работ по текущему ремонту МБУК "Центральная библиотечная система" НГО Центральная детская	г. Находка ул. Дзержинского, 12	Бурлакова Ольга Николаевна, Заместитель директора МКУ "ЦДМУК" НГО, 8 (4236) 69-98-55	
		Национальный проект "Демография"	Строительство крытого трассировочного катка	г. Находка, ул. Комсомольская, 34А	Арапов Олег Васильевич, начальник управления по физической культуре, спорту	Уточнение по датам выезда

Распределение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы по состоянию на 01.08.2023г.

Единица измерения: руб.

№	Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Касс. расход	% исп.
1	Ремонт моста через р. «Каменка» по Находкинскому проспекту, из них за счет	24,102,560.82	11,328,612.23	47.00
	Краевого бюджета	23,379,484.00	10,929,102.14	46.75
	Местного бюджета (софинансирование)	723,076.82	399,510.09	55.25
2	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов на территории, ограниченной жилой застройкой ООО ТПК "Ириа", территорией СНТ "Приморец", территорией ЖСК "Залив Тунгус" и обходной магистралью в г. Находка, в том числе за счет средств:	99,712,296.63	27,984,183.98	28.06
	Краевого бюджета	98,208,000.00	27,760,310.50	28.27
	Местного бюджета (софинансирование)	792,000.00	223,873.48	28.27
	Местного бюджета (дополнительные)	712,296.63	0.00	0.00
3	Создание и развитие системы газоснабжения муниципальных образований, в том числе за счет средств:	40,975,000.00	33,406,682.06	81.53
	Краевого бюджета	40,647,200.00	33,139,428.60	81.53
	Местного бюджета (софинансирование)	327,800.00	267,253.46	81.53
4	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находке, в том числе за счет средств:	335,681,751.52	81,549,361.94	24.29
	Федерального бюджета	331,162,080.00	80,183,566.33	24.21
	Местного бюджета (софинансирование)	3,345,071.52	809,935.02	24.21
	Местного бюджета (дополнительные)	1,174,600.00	555,860.59	47.32
	ВСЕГО РАСХОДОВ:	500,471,608.97	154,268,840.21	30.82
	Федеральный бюджет	331,162,080.00	80,183,566.33	24.21
	Краевой бюджет	162,234,684.00	71,828,841.24	44.27
	Местного бюджета (софинансирование)	5,187,948.34	1,700,572.05	32.78
	Местного бюджета (дополнительные)	1,886,896.63	555,860.59	29.46

Исполнение бюджета
за период с 01.01.2023г. по 01.08.2023г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Касс. Расход	% исп. (касс.расх.)
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Приобретение и установка модульных спортивных залов(4 общеобразовательных организации))	40,404,040.40	9,030,302.99	22.35
Федеральный бюджет	40,000,000.00	8,939,999.96	22.35
Местный бюджет	404,040.40	90,303.03	22.35
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (доп. средства из местного бюджета)	783,947.42	463,025.78	59.06
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка, г. Находка в 25 метрах на восток от здания по улице Дальней,30)	334,507,151.52	80,993,501.35	24.21
Федеральный бюджет	331,162,080.00	80,183,566.33	24.21
Местный бюджет	3,345,071.52	809,935.02	24.21
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (доп. средства из местного бюджета)	1,174,600.00	555,860.59	47.32
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (капитальный ремонт стадиона "Водник" в г. Находке)	35,049,797.98	6,052,262.58	17.27
Федеральный бюджет	34,699,300.00	5,991,739.95	17.27
Местный бюджет	350,497.98	60,522.63	17.27
Субсидии на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое в г. Находке в целях создания объекта туристической инфраструктуры)	190,234,949.50	106,265,278.51	55.86
Федеральный бюджет	188,332,600.00	105,202,625.73	55.86
Местный бюджет	1,902,349.50	1,062,652.78	55.86
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Реализация проекта "1000 дворов")	106,140,385.27	62,453,153.41	58.84
Федеральный бюджет	105,078,981.42	61,828,621.88	58.84
Местный бюджет	1,061,403.85	624,531.53	58.84
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации (доп. средства из местного бюджета)	755,000.00	32,000.00	4.24
ВСЕГО РАСХОДОВ:	706,336,324.67	264,794,498.84	37.49
Федеральный бюджет	699,272,961.42	262,146,553.85	37.49
Местный бюджет	7,063,363.25	2,647,944.99	37.49

**Распределение бюджетных ассигнований, направленных на реализацию
национальных проектов в Находкинском городском округе
в 2023 году (по состоянию на 01.08.2023 года)**

Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Кассовый расход	% исполн ения
Национальный проект "Жилье и городская среда" (региональный проект "Формирование комфортной городской среды") в том числе за счет средств:	58,220,184.03	40,443,561.73	69.47
<i>федеральный бюджет</i>	<i>43,954,079.58</i>	<i>33,228,209.35</i>	<i>75.60</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>897,022.03</i>	<i>678,126.73</i>	<i>75.60</i>
<i>местный бюджет</i>	<i>225,382.43</i>	<i>170,383.59</i>	<i>75.60</i>
<i>местный бюджет</i>	<i>13,143,699.99</i>	<i>6,366,842.06</i>	<i>48.44</i>
Национальный проект "Демография" (региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)", в том числе за счет средств:	134,984.56	0.00	0.00
<i>федеральный бюджет</i>	<i>128,316.32</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>2,618.70</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>местный бюджет</i>	<i>4,049.54</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Национальный проект "Культура" (региональный проект "Культурная среда"), в том числе за счет средств:	112,394,072.80	73,318,232.07	65.23
<i>федеральный бюджет</i>	<i>96,733,788.97</i>	<i>65,247,135.12</i>	<i>67.45</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>15,190,475.32</i>	<i>7,779,694.38</i>	<i>51.21</i>
<i>местный бюджет</i>	<i>469,808.51</i>	<i>291,402.57</i>	<i>62.03</i>
Национальный проект "Образование", в том числе:	23,197,815.30	8,871,931.86	38.24
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	1,607,815.30	0.00	0.00
<i>федеральный бюджет</i>	<i>1,575,658.99</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>32,156.31</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>местный бюджет</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-</i>
Региональный проект "Современная школа"	21,590,000.00	8,871,931.86	41.09
<i>краевой бюджет</i>	<i>21,590,000.00</i>	<i>8,871,931.86</i>	<i>41.09</i>
ВСЕГО РАСХОДОВ:	193,947,056.69	122,633,725.66	63.23
<i>федеральный бюджет</i>	<i>142,391,843.86</i>	<i>98,475,344.47</i>	<i>69.16</i>
<i>краевой бюджет</i>	<i>37,712,272.36</i>	<i>17,329,752.97</i>	<i>45.95</i>
<i>местный бюджет</i>	<i>13,842,940.47</i>	<i>6,828,628.22</i>	<i>49.33</i>

**Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению
"Твой проект" по состоянию на 01.08.2023г.**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Касс. расход	% исполн ения
Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"			
проект «Обустройство стадиона в п. Южно-Морском»,	2,895,000.00	0.00	0.00
Краевой бюджет	2,866,050.00	0.00	0.00
Местного бюджета	28,950.00	0.00	0.00
проект «Тропа здоровья»	2,400,000.00	0.00	0.00
Краевой бюджет	2,376,000.00	0.00	0.00
Местного бюджета	24,000.00	0.00	0.00
проект «Благоустройство ул. Набережной в с. Анна»	2,400,000.00	0.00	0.00
Краевой бюджет	2,376,000.00	0.00	0.00
Местного бюджета	24,000.00	0.00	0.00
проект «Спорт – норма жизни»	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
Краевой бюджет	2,970,000.00	2,970,000.00	100.00
Местного бюджета	30,000.00	30,000.00	100.00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	10,695,000.00	3,000,000.00	28.05
Краевого бюджета	10,588,050.00	2,970,000.00	28.05
Местного бюджета	106,950.00	30,000.00	28.05

**Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий
по состоянию на 01.08.2023г.**

Наименование показателя	Уточненная роспись/план	Касс. расход	% исполн ения
Благоустройство сельских территорий	6,754,081.25	0.00	0.00
Федерального бюджета	4,517,136.24	0.00	0.00
Краевого бюджета	92,186.45	0.00	0.00
Местного бюджета (софинансирование)	1,975,424.02	0.00	0.00
Местного бюджета (дополнительные)	169,334.54	0.00	0.00
ВСЕГО РАСХОДОВ:	6,754,081.25	0.00	0.00

Достижение показателей и индикаторов Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68



Рейтинг МО по достижению показателей Указа № 68 за 1 полугодие 2023 года

Место	Городские округа	Балл	Достигнуто/ не достигнуто
1	Владивосток	105,67	11 / 8
2	Дальнегорск	103,87	13 / 5
3	Находка	102,52	10 / 8
4	Фокино	101,29	8 / 10
5	Спасск-Дальний	99,88	12 / 6
6	Уссурийск	97,63	11 / 7
7	Арсеньев	97,45	10 / 8
8	Большой Камень	93,43	10 / 8
9	Артем	89,62	9 / 10
10	Партизанск	87,07	7 / 11
11	Лесозаводск	86,73	10 / 8
12	Дальнереченск	82,08	7 / 11

Рейтинг НГО по достижению показателей Указа № 68 за 1 полугодие 2023 года



Без отклонений	10
Некритические отклонения	7
Критические отклонения	1

Доверие к власти, %



Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
5	Доверие к Президенту Российской Федерации	1 полугодие 2023 г.	57,0	57,7	101%
4	Доверие к Губернатору Приморского края	1 полугодие 2023 г.	42,0	51,0	120%
2	Доверие к Главе Находкинского городского округа	1 полугодие 2023 г.	40	45	113%
1	Оценка общественного мнения в отношении достижения в регионе национальных целей	1 полугодие 2023 г.	7,0	18,3	120%

* - из 12 городских округов

Численность населения, тыс. чел.

Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
8	Численность населения НГО	1 полугодие 2023 г.	136,490	136,424	99%
6	Общий прирост численности населения	1 полугодие 2023 г.	-645	-712	90%
7	Миграционное сальдо	1 полугодие 2023 г.	-353	-375	94%
5	Естественная убыль	1 полугодие 2023 г.	-292	-337	85%

* - из 12 городских округов

Число сохраненных жизней, чел.



Место в рейтинге*	Показатель		Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
7	Число сохраненных жизней, чел.		1 полугодие 2023 г.	58	175	120%

* - из 12 городских округов

Уровень бедности, %

Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
2	Уровень регистрируемой безработицы	1 полугодие 2023 г.	0,8	0,5	120%
2	Количество самозанятых	1 полугодие 2023 г.	5 850	6 585	113%
2	Темп роста реальной заработной платы	1 полугодие 2023 г.	109,8	111,1	101%
1	Номинальная начисленная заработная плата	1 полугодие 2023 г.	82 378	81 447	99%

* - из 12 городских округов

Доля граждан, занимающихся ФКиС, %

Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
6	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	1 полугодие 2023 г.	50,45	51,24	102%

* - из 12 городских округов

Объём жилищного строительства, тыс. кв.м.

Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
8	Объём жилищного строительства, тыс. кв.метров	1 полугодие 2023 г.	39,000	40,838	105%

* - из 12 городских округов

Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.

Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
7	Число посещений библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, число обращений к библиотеке удаленных пользователей), тыс. ед.	1 полугодие 2023 г.	355,51	311,40	88%
9	Число посещений культурно-массовых мероприятий, учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед.	1 полугодие 2023 г.	431,83	407,51	94%

* - из 12 городских округов

Количество волонтеров, тыс. чел.

Место в рейтинге*	Показатель	Отчетный период	План на отчетный период	Факт за отчетный период	Процент достижения
12	Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольничества (волонтерства) в добровольческую (волонтерскую) деятельность), тыс. чел.	1 полугодие 2023 г.	2 775	2 160	78%

* - из 12 городских округов
